



گزارش بازاریابی

شرکت آب و فاضلاب تهران

شماره گزارش		۱		شماره قرارداد		۱۳۱۱۳/۱۸۹۶۱		نام پروژه		061316020212011605100to061316020212011608000		
ویژگی پروژه	نام کارفرما		نام مشاور		نام پیمانکار		نام پیمایشگر		نام ناظر			
	شرکت آب و فاضلاب تهران		شرکت مهاب قدس		شرکت دریا کار یزد		جناب آقای ۱۰۰۰		-			
ویژگی بستر پروژه	پیمانکار اجرا		شماره قرارداد پیمانکار اجرا		شماره مرجع لوله (کد یونیک یا کد المان)							
	شرکت پیمانکاری ۱		۴۷۴۱۱		۱							
آدرس پروژه	استان		شهرستان		آدرس							
	تهران		تهران		خیابان اینارگران شمالی							
ویژگی ویدئومتری	هدف از بازرسی		وضعیت منطقه		شرایط آب و هوایی		تاریخ بازرسی		زمان بازرسی		شستشو پیش از بازرسی؟	
	بررسی و تحقیق در مورد عیوب سازه‌ای و سرویس دهی		شهر		باران و برف نمی بارد		۱۴۰۵/۶/۱۵		۱۱:۴۱:۰۹		بلی	
ویژگی آدمرو	آدمرو	شماره مرجع آدمرو	شماره آدمرو	عمق آدمرو	تعداد مجرا	پله	نوع دریچه	وضعیت دریچه	نوع آدمرو			
	پایین دست	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۰۵۱۰۰	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۰۵۱۰۰	۳	۲	دارد	چدنی	سالم	بتنی			
	بالادست	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۰۸۰۰۰	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۰۸۰۰۰	۳	۲	دارد	چدنی	سالم	بتنی			
ویژگی فاضلابرو	طول فاضلابرو		سایز لوله		کاربری فاضلابرو		شکل سطح مقطع		جنس			
	۷		۲۵۰		فاضلاب مجرا		دایروی		پلی اتیلن			
نتیجه ویدئومتری	طول ویدئو متری شده		طول ویدئو متری نشده		شیب متوسط لوله (طراحی)		شیب متوسط لوله (ساخته شده)		نتیجه ویدئومتری			
	۶.۳۹		۰.۶۱				-۱۱.۰۳		مسیر لوله کامل طی شد			
	مسیر ویدئومتری				محل توقف ویدئومتری				دلیل توقف ویدئومتری			
	در جهت جریان				۶.۳۹							
	خلاف جهت جریان											
توضیحات				تست ۳۴۵؛ Structure Score:۰؛ GainScore:۰								

 شرکت دریا کار یزد	گزارش استاندارد	
	شرکت آب و فاضلاب تهران	

نام کارفرما		شرکت آب و فاضلاب تهران		نام پیمایشگر		جناب آقای ۱۰۰	
نام ناظر	شماره قرارداد	کد تخصیصی پیمانکار	نام ح.س. تصفیه خانه	منطقه آبفا			
-	۱۳۱۱۳/۱۸۹۶۱	۱					
شماره مرجع لوله	تاریخ	ساعت	نام خیابان	شهرستان			
۱	۱۴۰۵/۶/۱۵	۱۱:۴۱:۰۹	خیابان ایثارگران شمالی	تهران			
کد محل فاضلابرو	ش.مرجع آدمرو ابتدایی	عمق آدمرو ابتدایی	کاربری شبکه	نوع شبکه	جهت بازرسی		
RD	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۰۵۱۰۰	۳		A	D		
ارتفاع سطح مقطع	عرض سطح مقطع	شکل سطح مقطع	جنس	جنس پوشش داخلی	پیش شستشو	روش نصب پوشش داخلی	توضیحات عمومی
۲۵۰	۲۵۰	C	PE	PE	Y	M	تست ۳۴۵
درجه بحرانی بودن	هدف از بازرسی	نحوه کنترل جریان	شرایط آب و هوایی	دمای هوا	طول لوله	طول قطعه لوله	سال ساخت
A	A	N	D	A	۷	۶	۱۳۵۵
استاندارد کد گذاری	محل ذخیره فیلم	روش آدرس دهی ویدئو	ش.م. ذخیره فیلم	محل ذخیره عکس ها	ش.م. ذخیره عکس ها		
WRc	ذخیره بر روی DVD/DVD	زمان سپری شده از شروع بازرسی با فرمت hh:mm:ss					


جدول عیوب استاندارد

ردیف	زمان ویدئو	موقعیت	عیب پیوسته	حروف				اعداد					
				کد	بند	جنس	شدت	ابعاد		درصد	موقعیت عیب		
								۱	۲		در / از	تا	
۱	۰۰:۰۰	۱.۰۰		MH			نقطه ی شروع / آدمرو						
۲	۰۰:۰۰	۱.۰۰		WLT			تراز آب / تراز آب کدر			۵			
۳	۰۰:۱۷	۴.۳۱		OJ			اتصال باز / به میزان % قطر						
۴	۰۰:۰۰	۶.۳۹		MHF			نقطه ی پایان / آدمرو						


شرکت آب و فاضلاب تهران گزارش گرافیکی وضعیت شبکه		
شرکت دریا کاریزد		
نام پروژه / شماره گزارش	061316020212011605100to061316020212011608000	شماره آدمرو پایین دست
جهت حرکت	حرکت در راستای جهت جریان/D	شماره آدمرو بالادست
طول ویدئومتری شده	۶.۳۹	طول ویدئومتری نشده
		۰.۶۱
		۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۰۵۱۰۰
		۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۰۸۰۰۰

ردیف	زمان ویدئو	موقعیت	کد	شرح عیب
۱	۰۰:۰۰	۱.۰۰	MH	سایر جزئیات / نقطه c, شوه ۶ آدمرو
۲	۰۰:۰۰	۱.۰۰	WLT	سرویس دهی / تراز آب تراز آب کدر ۵
۳	۰۰:۱۷	۴.۳۱	OJ	سازه ای / اتصال باز به میزان % قطر
۴	۰۰:۰۰	۶.۳۹	MHF	سایر جزئیات / نقطه ی پایان آدمرو

 شرکت دریا کاریزه			گزارش تصویری
شرکت آب و فاضلاب تهران			
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۰۵۱۰۰	شماره آدمرو پایین دست	316020212011605100to0613160202120116084	نام پروژه / شماره گزارش
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۰۸۰۰۰	شماره آدمرو بالا دست	حرکت در راستای جهت جریان D/	جهت حرکت

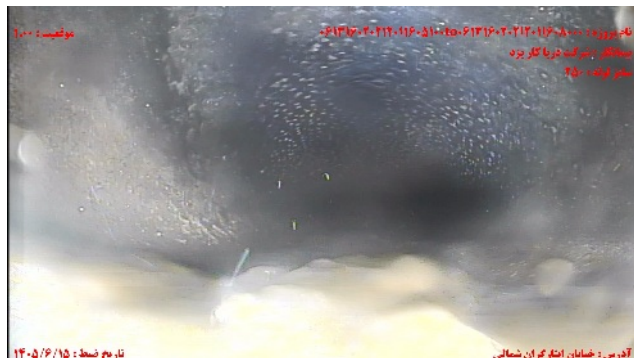

شماره تصویر ۱
عنوان نقطه ی شروع / آدمرو
موقعیت ۱۰۰ کد MH

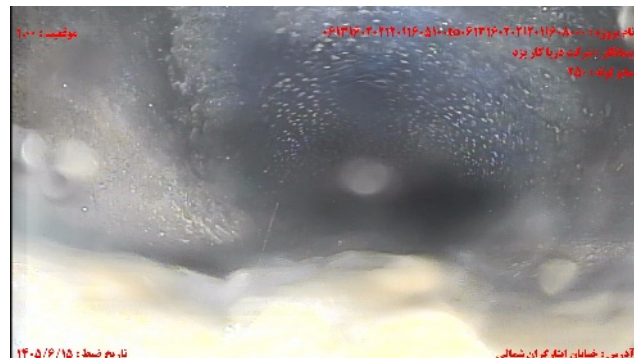

شماره تصویر ۲
عنوان تراز آب / تراز آب کدر
موقعیت ۱۰۰ کد WLT
درصد ۵



شماره تصویر ۳
عنوان اتصال باز / به میزان % قطر
موقعیت ۴۰۳۱ کد OJ



شماره تصویر ۴
عنوان نقطه ی پایان / آدمرو
موقعیت ۶۰۳۹ کد MHF



شرکت دریا کاریز


گزارش شیب

شرکت آب و فاضلاب تهران

۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۰۵۱۰۰	شماره آدمرو بالادست	061316020212011605100to061316020212011608000	نام پروژه / شماره گزارش
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۰۸۰۰۰	شماره آدمرو پایین دست	حرکت در راستای جهت جریان D/	جهت حرکت
-۱۱.۰۳	شیب متوسط لوله (ساخته شده)		شیب متوسط لوله (طراحی شده)

شیب متوسط اندازه گیری شده % -۱۱.۰۳

شیب بر حسب موقعیت

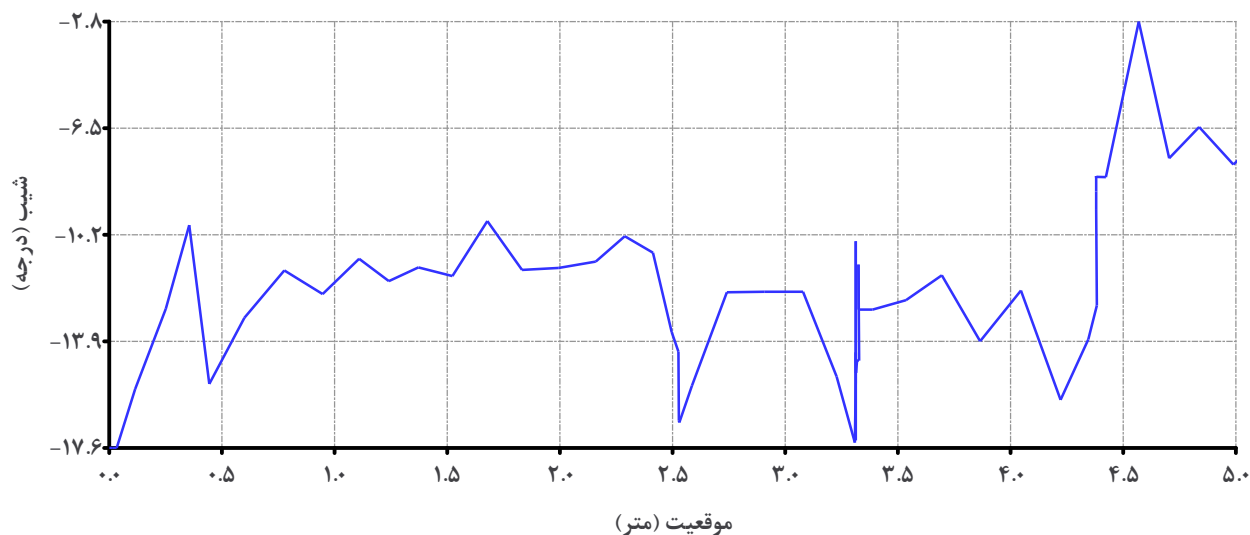

ارتفاع بر حسب موقعیت

